



B I C

VERTROUWELIJK

# Belgische Industriële Controle v.z.w

Erkend Controleorganisme  
Externe dienst voor de technische controles op de arbeidsplaats



Certificaat n°200-INSP

Brussel : 126, PB 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel

Tel : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78

Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Tel : 04 234 17 00 Fax : 04 234 17 80

B.T.W. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

Nr 0994

Verlag nr : 0406.06.22.003 Conformiteitsverslag - Huishoudelijke bestaande LS / ZLS installatie

Betreft : Bedroomd Appartement  
Aanvrager : Van der Spiegel Mr. Hemendreef 91 2930 Brasschaat  
Persoon ter plaatse : Mr. D. van der Spiegel EAN-code van de installatie :  
Adres van bezoek : Voshaller en 2930 Brasschaat  
Datum van bezoek : 22.06.2011 Datum redactie : 22.06.2011 Referenties klant : 0442.786.527  
Reglementaire voorschriften : AREI art. 276 met gebruik van de uitzonderingen van  art. 271 bis  art. 278  
Gebruikte BIC-vzw procedure : PRO-INS-E-11

### Beschrijving van de bezochte installatie :

Nominale spanning : <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 2x230V <input checked="" type="checkbox"/> 1N400V	Algemene bescherming van de aansluiting : <u>40 A</u> Aantal borden : <u>1</u> aantal eindstroombanen : <u>18+2</u>
---	--

### Controles door visueel onderzoek, testen en metingen :

Beschrijving	In orde	Niet in orde	Niet v toep. of uitzondering.
Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's	<u>✓</u>		
Staat van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel	<u>✓</u>		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking	<u>✓</u>		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking, werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testknop. Nota : differentieel <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> niet verzegelbaar <input type="checkbox"/> terug verzegeld	<u>✓</u>		
Foutlussen en juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen	<u>✓</u>		
Continuïteit van de: equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende), continuïteit vb de beschermingsgeleiders tot de apparaten	<u>✓</u>		
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel	<u>✓</u>		
Visuele controle van verplaatsbaar materieel, op het moment van de controle aangeschakeld	<u>✓</u>		
De doorsnede van de geleiders behoren tot het M.B. van 27/7/1981 & uitz.	<u>✓</u>		
Algemene isolatieniveau : <u>... 1 ... MΩ</u>	<u>✓</u>		
Spreadingsweerstand van de aardelektrode : <u>... 30 ... Ω</u>	<u>✓</u>		

Identificatie van de meetapparaten : CIB-E-ME 12 ; CIB-E-MET- 15 CIB-E-TEC- 11 ; CIB-E-MUL- 20

### Gebreken / Nota's :

### Besluiten :

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn 22.06.2016
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :
- De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een aanvullend onderzoek is uit te voeren door ~~dezelfde~~ hetzelfde organisme vóór herindienststelling van de installatie.

Naam en handtekening van de inspecteur :  
in opdracht voor BIC,

Naam en handtekening van de aanvrager, voor ontvangst :


Wim De Laet  
22 JUN 2011







appartement

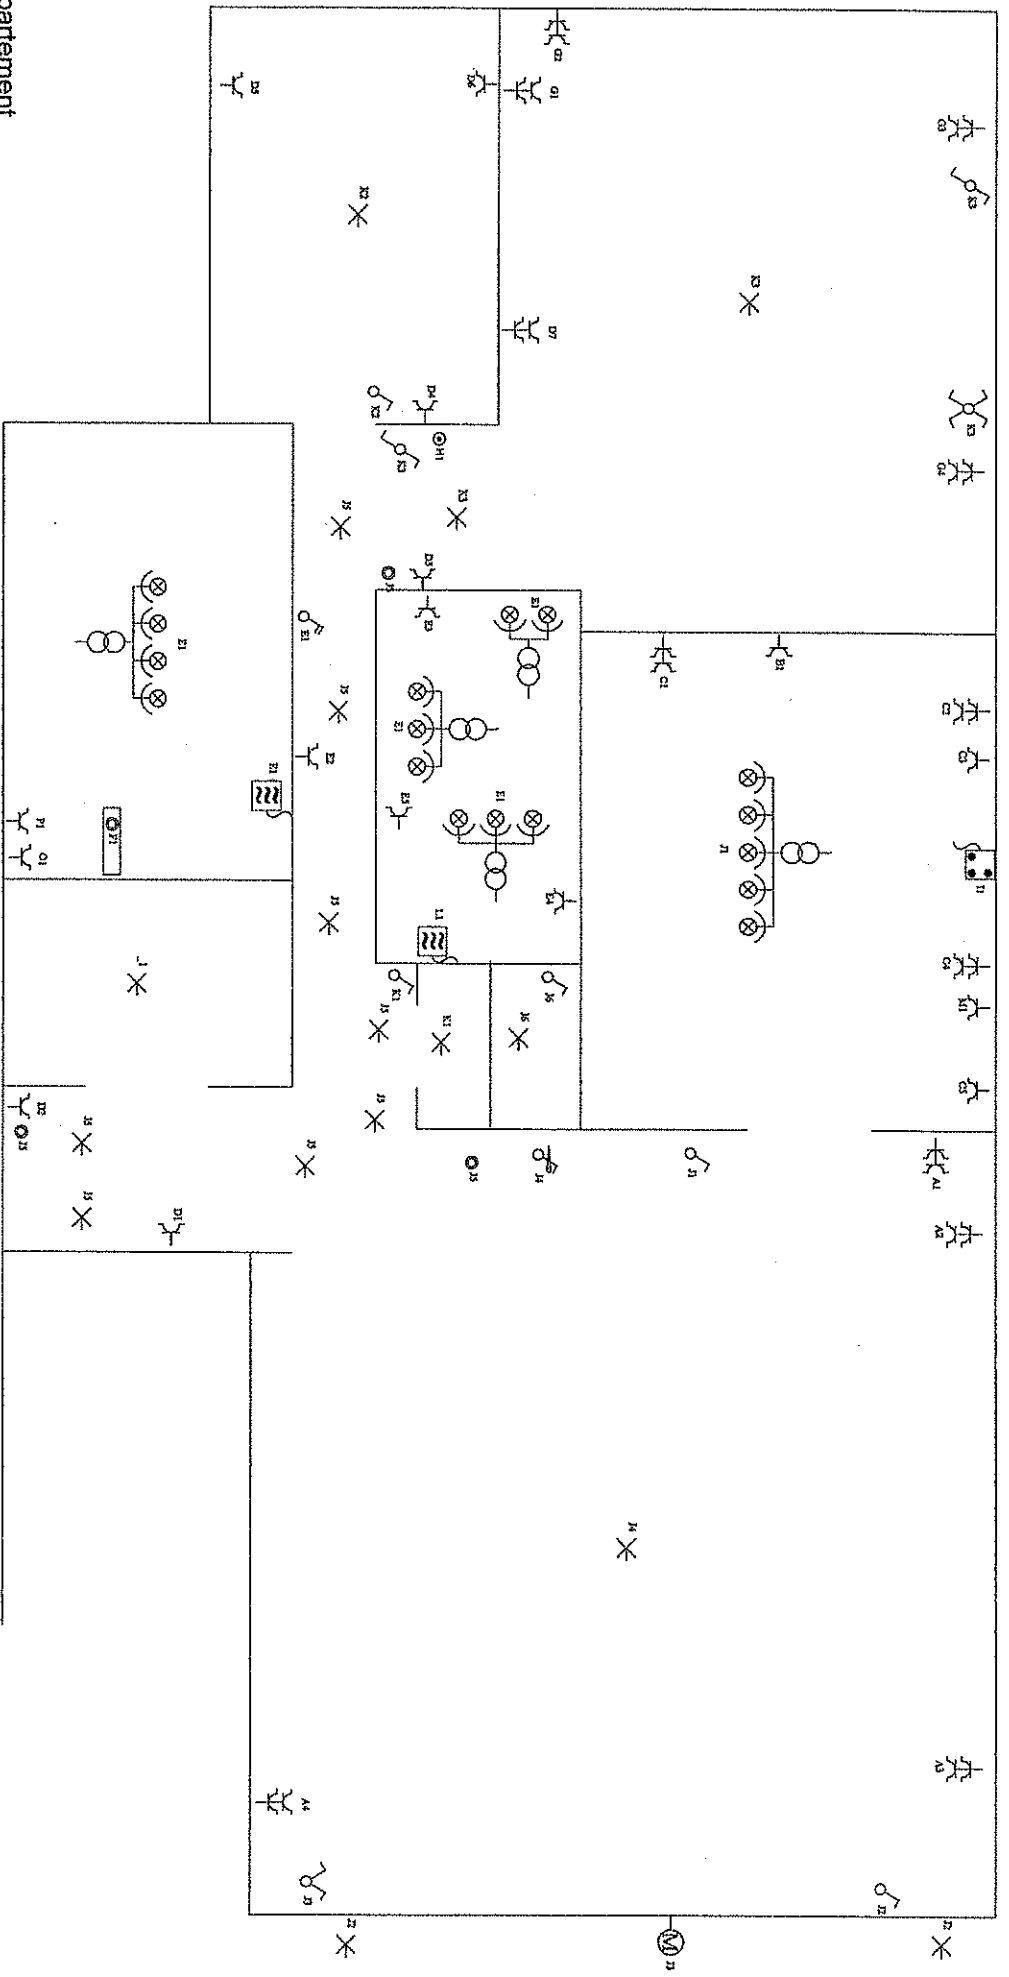

<b>INSTALLATEUR</b> Naam/Nom Van der Spiegel NV BTW / TVA BE 0442786897 Datum/Date 22-06-2011 Handtekt/Sign	<b>KEURING/CONTROLE</b> Organs. Naam/Nom <b>DEL</b> Datum/Date <b>22 JUN 2011</b> Handtekt/Sign <b>Wim</b>	<b>WERFCHANTIER</b> Naam/Nom Straat/Rue <b>Usskadelei 2A</b> Gemeen/Comm. <b>2830 Breda</b> Handtekt/Sign	<b>FIX-O-CAD</b> TN, (400V)/230V- <b>VYNGKIJER</b> 02341
---	--	---	---

